

Status på helhedsplanen i afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej

Nr. 1 - april 2019

FÆLLES
FREMTID

Som opfølgning på temamødet i februar 2019 vil afdelingsbestyrelsen fremover modtage en halvårlig status på helhedsplanen for jeres afdeling.

Da dette er første status følger her en kort opsummering af processen fra helhedsplanen blev sat gang i jeres afdeling til nu.

Processen indtil nu

Det hele bliver skudt i gang i **foråret 2012**, hvor der afholdes en række workshops med de beboere på Valdemarsvej/Thyrasvej, som har interesse i renoveringsprojektet. Med udspiring i beboernes input bliver der udarbejdet en *foreløbig helhedsplan*, der indeholder en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse af bebyggelsen, forslag til indretningsplaner og renovering af udearealerne – kort sagt en samlet vision for afdelingen. Planen sendes til Landsbyggefonden i januar 2013.


I oktober 2014, ca. halvandet år efter Landsbyggefonden modtager helhedsplanen, kommer de på besigtigelse i afdelingen. På besigtigelsen kommenterer Landsbyggefonden på planen og oplyser, at de ser grundlag for, at der arbejdes videre med planen. Det betyder, at den foreløbige helhedsplan nu skal justeres og tilpasses – udarbejdelsen af den endelige helhedsplan er nu sat i gang.

Der har været fremsendt større mængder af materiale til Landsbyggefonden af to omgange. Første gang i december 2015, hvor indretningsplanerne blev justeret enkelte steder. Anden gang i september 2018, hvor indretningsplanerne endnu engang fik en mindre justering for at imødekomme Herning Kommunes krav om flere mindre og billigere boliger i Herning. I processen har Landsbyggefonden desuden stillet krav om, at forskellige byggetekniske forhold dokumenteres grundigt. Det er gjort, for at sikre den bedste økonomi i projektet. På www.fællesfremtid.dk - under afd. 019 Mindeparken finder du alle relevante dokumenter, hvis du ønsker at vide mere.

Hvor ligger afd. 024 på renoveringsvejen?

Vi har i Projektafdelingen hos FællesBo udarbejdet illustrationen "Vejen til renovering med støtte fra landsbyggefonden". Vejen består af følgende faser i et renoveringsprojekt:

1. Foreløbig helhedsplan
2. Endelig helhedsplan
3. Beboergodkendelse/Kommunal godkendelse
4. Projektering
5. Udbud/Kommunal godkendelse
6. Genhusning og renovering
7. Indflytning
8. 1. og 5. årseftersyn

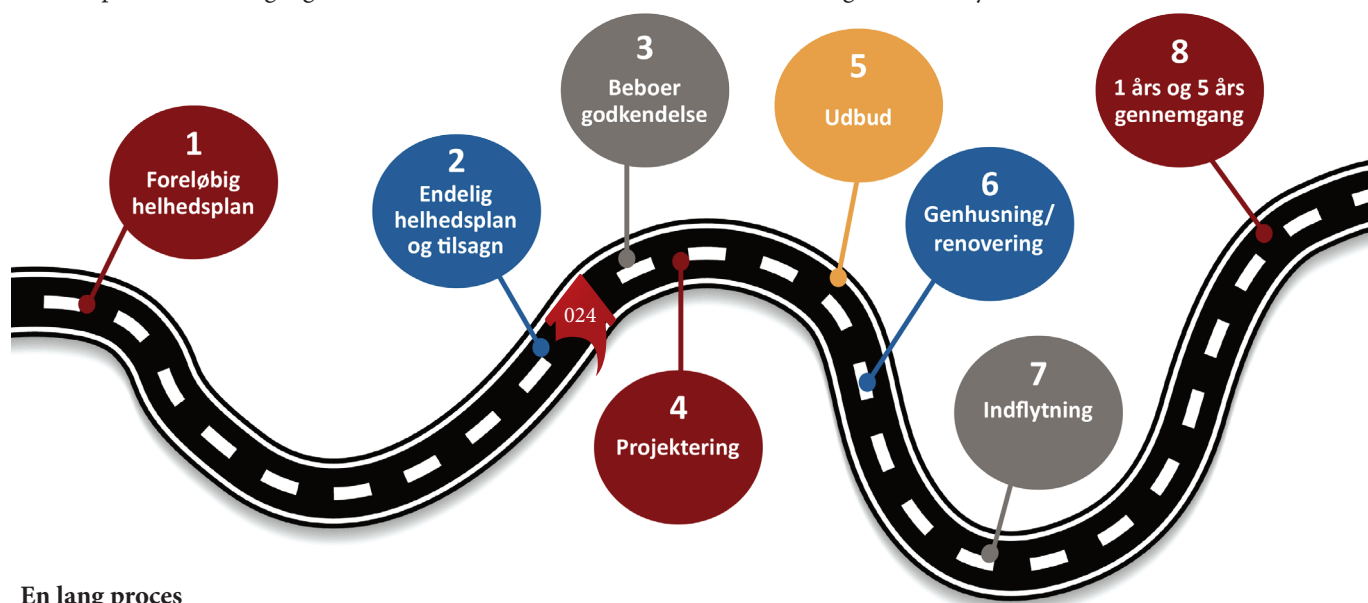

En lang proces

Udarbejdelsen af den endelige helhedsplan for jeres afdeling har været en lang og tidskrævende proces. Der har været meget dialog med Landsbyggefonden for at sikre at I som lejere får mest for pengene.

Som det fremgår af illustrationen er jeres helhedsplan stadig i *fase 2 - Endelig helhedsplan*. Vi er langt i processen, men

Statusbrevet

Afdelingsbestyrelsen modtager to gange årligt et statusbrev om arbejdet med helhedsplanen. Du kan finde samtlige statusbreve på www.fællesfremtid.dk under din afdeling.

Du er også velkommen til at kontakte projektafdelingen på 96 26 58 58, hvis du har spørgsmål til helhedsplanen.

FÆLLESBO

Status på helhedsplanen i afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej

Nr. 1 - april 2019



desværre ikke i mål endnu. Der er megen ventetid når vi fremsender svarskrivelser og forespørgsler til Landsbyggefonden og processen er derfor lang.

Hvornår går renoveringen i gang?

Det er selvfølgelig det store spørgsmål. Nu har arbejdet stået på i mere end syv år, og I har sikkert været klar til at gå i gang for længe side. Vi stiller os hos FællesBo også undrende i forhold til, at processen med Landsbyggefonden er så lang.

Når vi henvender os til andre boligorganisationen hører vi dog den samme historie – nemlig at der er LANG ventetid. Men I skal vide, at vi presser på, alt hvad vi kan.

Landsbyggefonden har officielt meldt ud, at Valdemarsvej/Thyrasvej får tilsagn om midler i 2021. Efterfølgende skal helhedsplanen godkendes på afdelingsmøde og renoveringen skal detailplanlægges og udbydes til en entreprenør inden renoveringen kan gå i gang. Det betyder, at der vil gå ca. et år fra Landsbyggefondens tilsagn om midler, til renoveringen rent faktisk går i gang.

I vil på disse halvårlige statusskrivelser blive orienteret, hvis Landsbyggefondens udmelding om tilsagn ændrer sig.

Betonskader på altankonstruktioner

Projektafdelingen i FællesBo er i gang med at få undersøgt betonskader på altankonstruktionerne i afdelingen. Hvis det viser sig nødvendigt, at skaderne skal udbedres, inden helhedsplanen igangsættes, vil vi gå i dialog med Landsbyggefonden om, at arbejdet kan støttes af Landsbyggefonden som en del af den kommende helhedsplan. I vil blive informeret om forløbet på vores hjemmeside www.fællesfremtid.dk eller pr. brev eller mail.

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

Det er en plan, som samler alle boligafdelingens behov for renovering og fremtidssikring af boliger, bygninger, udearealer og det sociale liv.

Landsbyggefonden støtter en del af helhedsplanen, som handler om fremtidssikring samt håndtering af byggeskader.

HVEM ER LANDSBYGGEFONDEN?

Landsbyggefonden er almene boligafdelingers fælles opsparing, indbetalt som en del af huslejen. Den skal bruges til byggeri og renoveringsopgaver.

Fonden yder billige lån og støtte til helhedsplaner. Det gør det billigere, end hvis beboerne skulle betale alle arbejder.

Ved inddragelse af Landsbyggefonden er det således muligt at gennemføre en gennemgribende renovering i en boligafdeling uden markante huslejestigninger.

Landsbyggefonden dækker hele landet, og der er lang ventetid.

Man kan kun få støtte til renoveringer, der ligger ud over almindeligt vedligehold.
